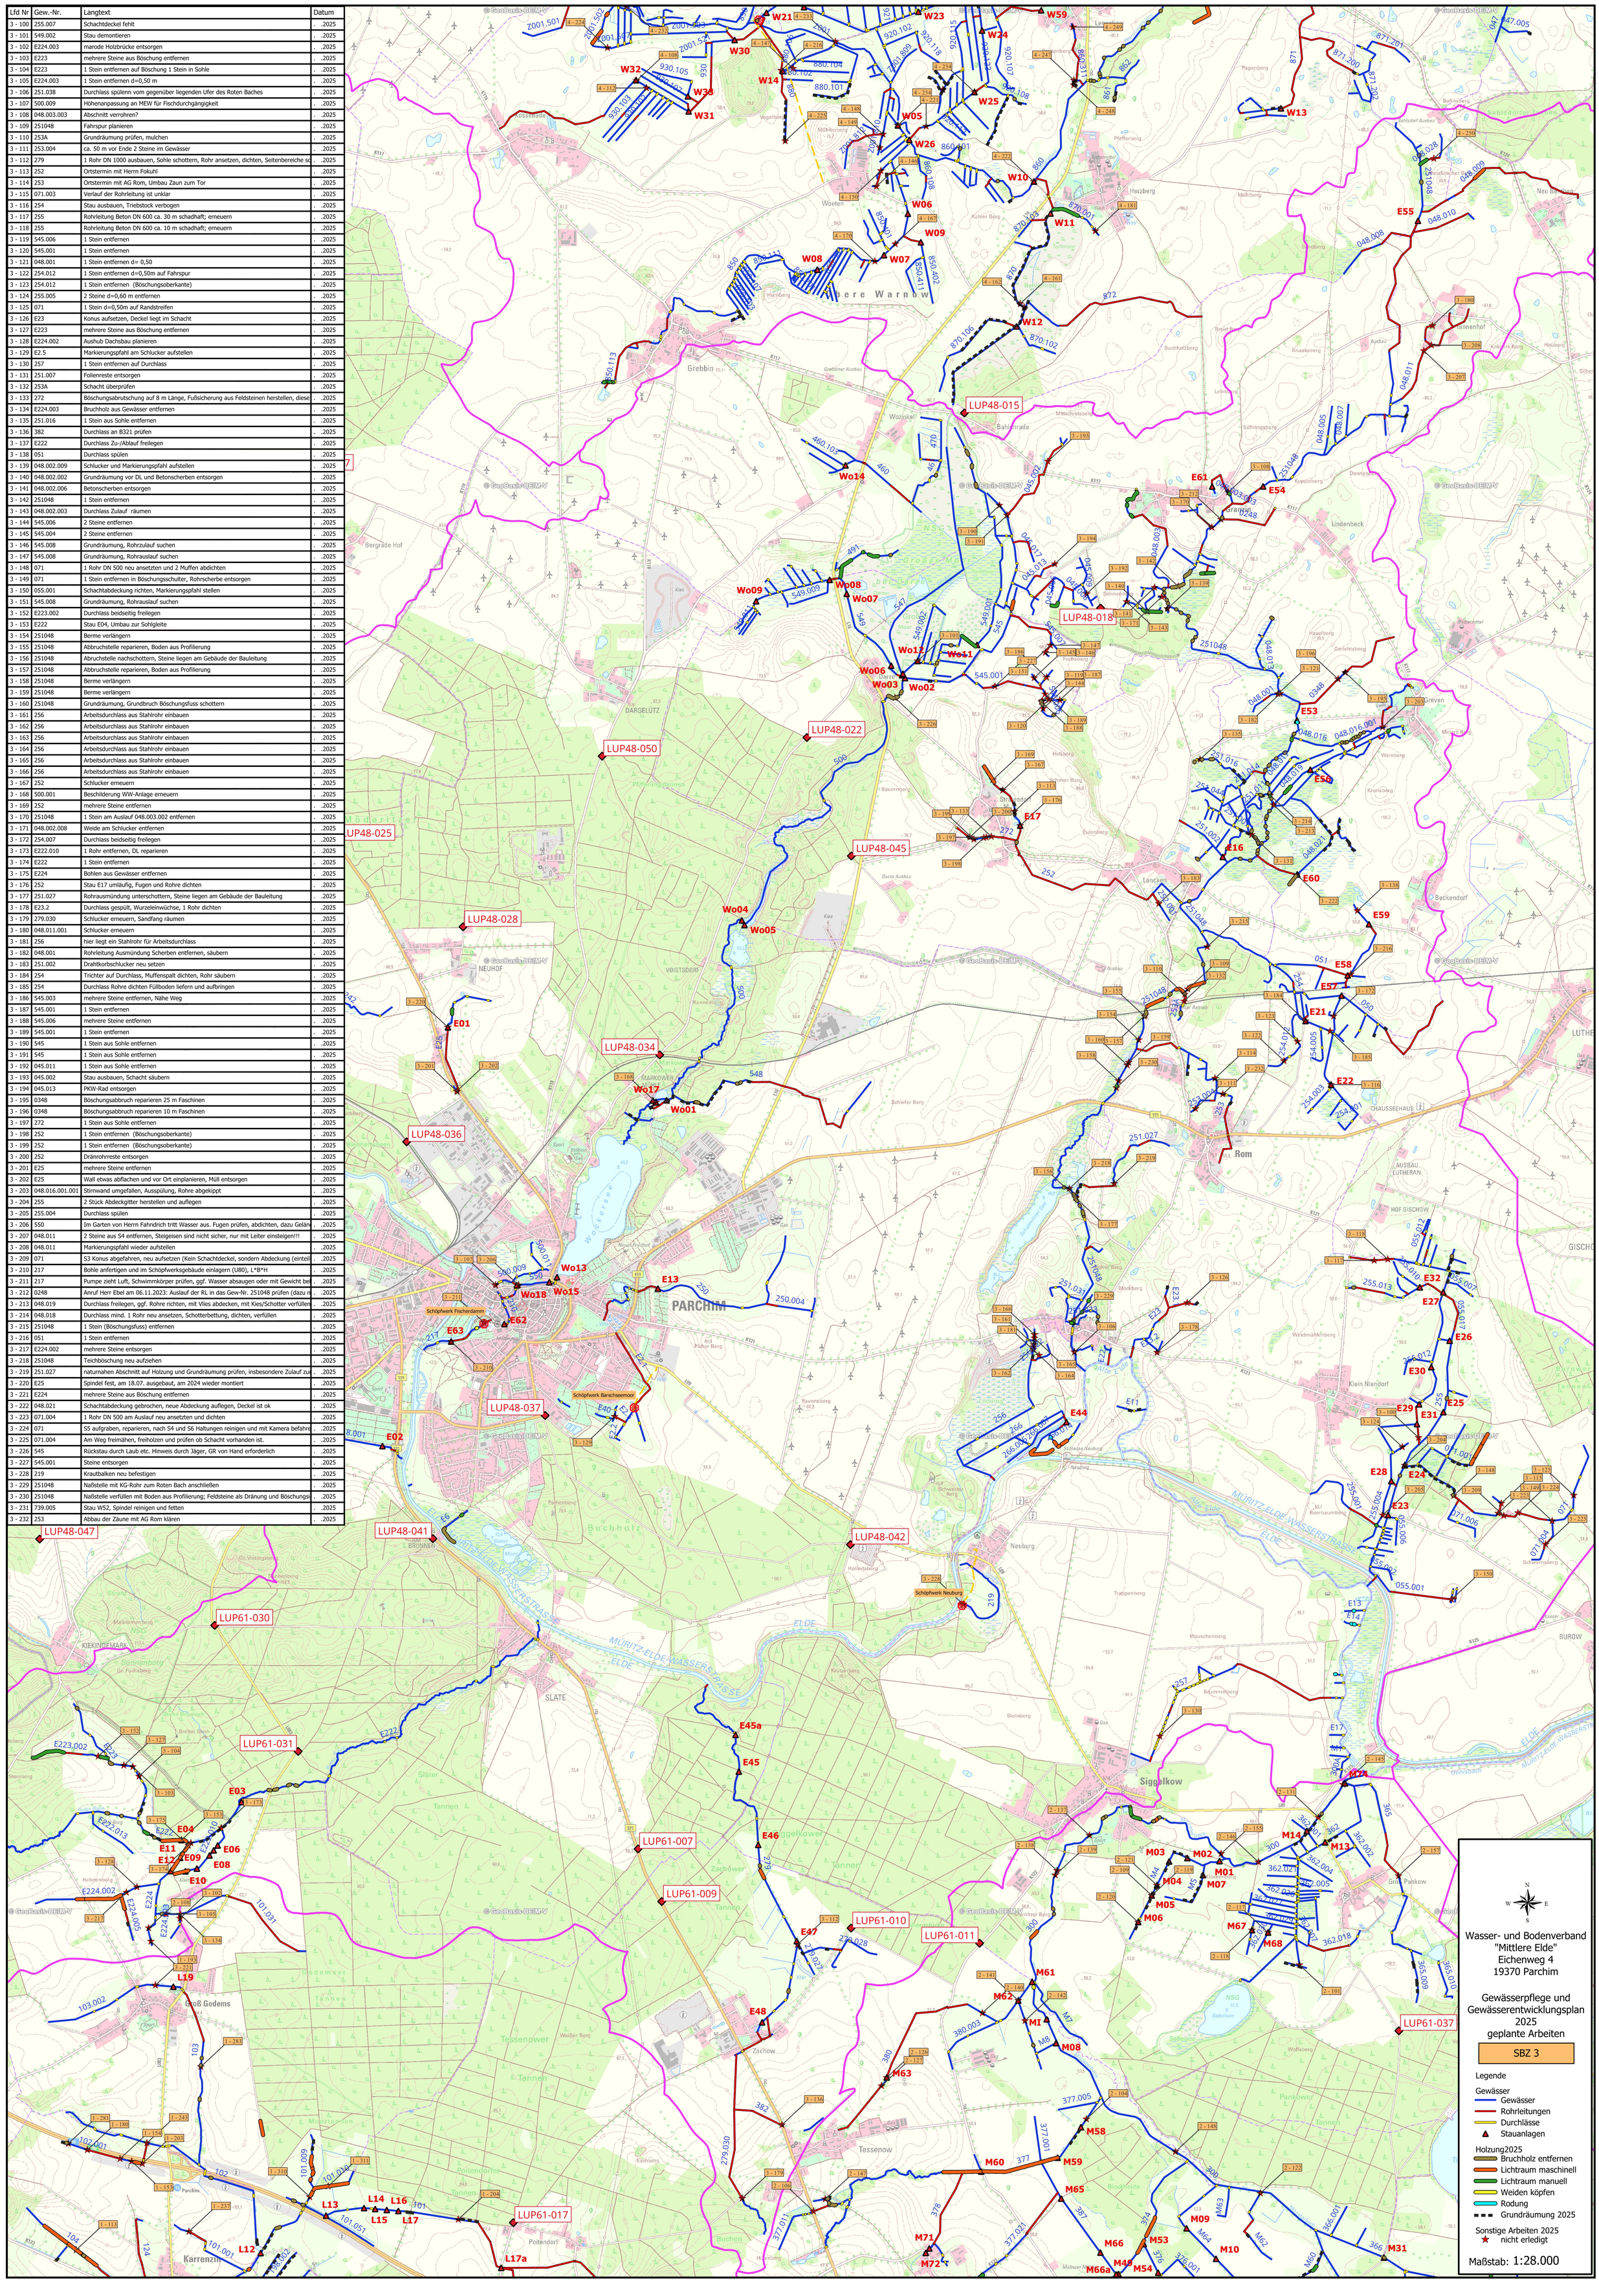Lfd Nr	Gew.-Nr.	Langtext	Datum
3 - 100	255.007	Schachtdeckel fehlt	. .2025
3 - 101	549.002	Stau demontieren	. .2025
3 - 102	E224.003	marode Holzbrücke entsorgen	. .2025
3 - 103	E223	mehrere Steine aus Böschung entfernen	. .2025
3 - 104	E223	1 Stein entfernen auf Böschung 1 Stein in Sohle	. .2025
3 - 105	E224.003	1 Stein entfernen d=0,50 m	. .2025
3 - 106	251.038	Durchlass spülenn vom gegenüber liegenden Ufer des Roten Baches	. .2025
3 - 107	500.009	Höhenanpassung an MEW für Fischdurchgängigkeit	. .2025
3 - 108	048.003.003	Abschnitt verrohren?	. .2025
3 - 109	251048	Fahrspur planieren	. .2025
3 - 110	253A	Grundräumung prüfen, mulchen	. .2025
3 - 111	253.004	ca. 50 m vor Ende 2 Steine im Gewässer	. .2025
3 - 112	279	1 Rohr DN 1000 ausbauen, Sohle schottern, Rohr ansetzen, dichten, Seitenbereiche sc	. .2025
3 - 113	252	Ortstermin mit Herrn Fokuhl	. .2025
3 - 114	253	Ortstermin mit AG Rom, Umbau Zaun zum Tor	. .2025
3 - 115	071.003	Verlauf der Rohrleitung ist unklar	. .2025
3 - 116	254	Stau ausbauen, Triebstock verbogen	. .2025
3 - 117	255	Rohrleitung Beton DN 600 ca. 30 m schadhaft; erneuern	. .2025
3 - 118	255	Rohrleitung Beton DN 600 ca. 10 m schadhaft; erneuern	. .2025
3 - 119	545.006	1 Stein entfernen	. .2025
3 - 120	545.001	1 Stein entfernen	. .2025
3 - 121	048.001	1 Stein entfernen d= 0,50	. .2025
3 - 122	254.012	1 Stein entfernen d=0,50m auf Fahrspur	. .2025
3 - 123	254.012	1 Stein entfernen (Böschungsoberkante)	. .2025
3 - 124	255.005	2 Steine d=0,60 m entfernen	. .2025
3 - 125	071	1 Stein d=0,50m auf Randstreifen	. .2025
3 - 126	E23	Konus aufsetzen, Deckel liegt im Schacht	. .2025
3 - 127	E223	mehrere Steine aus Böschung entfernen	. .2025
3 - 128	E224.002	Aushub Dachsbau planieren	. .2025
3 - 129	E2.5	Markierungspfahl am Schlucker aufstellen	. .2025
3 - 130	257	1 Stein entfernen auf Durchlass	. .2025
3 - 131	251.007	Folienreste entsorgen	. .2025
3 - 132	253A	Schacht überprüfen	. .2025
3 - 133	272	Böschungsabrutschung auf 8 m Länge, Fußsicherung aus Feldsteinen herstellen, diese	. .2025
3 - 134	E224.003	Bruchholz aus Gewässer entfernen	. .2025
3 - 135	251.016	1 Stein aus Sohle entfernen	. .2025
3 - 136	382	Durchlass an B321 prüfen	. .2025
3 - 137	E222	Durchlass Zu-/Ablauf freilegen	. .2025
3 - 138	051	Durchlass spülen	. .2025
3 - 139	048.002.009	Schlucker und Markierungspfahl aufstellen	. .2025
3 - 140	048.002.002	Grundräumung vor DL und Betonscherben entsorgen	. .2025
3 - 141	048.002.006	Betonscherben entsorgen	. .2025
3 - 142	251048	1 Stein entfernen	. .2025
3 - 143	048.002.003	Durchlass Zulauf räumen	. .2025
3 - 144	545.006	2 Steine entfernen	. .2025
3 - 145	545.004	2 Steine entfernen	. .2025
3 - 146	545.008	Grundräumung, Rohrzulauf suchen	. .2025
3 - 147	545.008	Grundräumung, Rohrauslauf suchen	. .2025
3 - 148	071	1 Rohr DN 500 neu ansetzten und 2 Muffen abdichten	. .2025
3 - 149	071	1 Stein entfernen in Böschungsschulter, Rohrscherbe entsorgen	. .2025
3 - 150	055.001	Schachtabdeckung richten, Markierungspfahl stellen	. .2025
3 - 151	545.008	Grundräumung, Rohrauslauf suchen	. .2025
3 - 152	E223.002	Durchlass beidseitig freilegen	. .2025
3 - 153	E222	Stau E04, Umbau zur Sohlgleite	. .2025
3 - 154	251048	Berme verlängern	. .2025
3 - 155	251048	Abbruchstelle reparieren, Boden aus Profilierung	. .2025
3 - 156	251048	Abruchstelle nachschottern, Steine liegen am Gebäude der Bauleitung	. .2025
3 - 157	251048	Abbruchstelle reparieren, Boden aus Profilierung	. .2025
3 - 158	251048	Berme verlängern	. .2025
3 - 159	251048	Berme verlängern	. .2025
3 - 160	251048	Grundräumung, Grundbruch Böschungsfuss schottern	. .2025
3 - 161	256	Arbeitsdurchlass aus Stahlrohr einbauen	. .2025
3 - 162	256	Arbeitsdurchlass aus Stahlrohr einbauen	. .2025
3 - 163	256	Arbeitsdurchlass aus Stahlrohr einbauen	. .2025
3 - 164	256	Arbeitsdurchlass aus Stahlrohr einbauen	. .2025
3 - 165	256	Arbeitsdurchlass aus Stahlrohr einbauen	. .2025
3 - 166	256	Arbeitsdurchlass aus Stahlrohr einbauen	. .2025
3 - 167	252	Schlucker erneuern	. .2025
3 - 168	500.001	Beschilderung WW-Anlage erneuern	. .2025
3 - 169	252	mehrere Steine entfernen	. .2025
3 - 170	251048	1 Stein am Auslauf 048.003.002 entfernen	. .2025
3 - 171	048.002.008	Weide am Schlucker entfernen	. .2025
3 - 172	254.007	Durchlass beidseitig freilegen	. .2025
3 - 173	E222.010	1 Rohr entfernen, DL reparieren	. .2025
3 - 174	E222	1 Stein entfernen	. .2025
3 - 175	E224	Bohlen aus Gewässer entfernen	. .2025
3 - 176	252	Stau E17 umläufig, Fugen und Rohre dichten	. .2025
3 - 177	251.027	Rohrausmündung unterschottern, Steine liegen am Gebäude der Bauleitung	. .2025
3 - 178	E23.2	Durchlass gespült, Wurzeleinwüchse, 1 Rohr dichten	. .2025
3 - 179	279.030	Schlucker erneuern, Sandfang räumen	. .2025
3 - 180	048.011.001	Schlucker erneuern	. .2025
3 - 181	256	hier liegt ein Stahlrohr für Arbeitsdurchlass	. .2025
3 - 182	048.001	Rohrleitung Ausmündung Scherben entfernen, säubern	. .2025
3 - 183	251.002	Drahtkorbschlucker neu setzen	. .2025
3 - 184	254	Trichter auf Durchlass, Muffenspalt dichten, Rohr säubern	. .2025
3 - 185	254	Durchlass Rohre dichten Füllboden liefern und aufbringen	. .2025
3 - 186	545.003	mehrere Steine entfernen, Nähe Weg	. .2025
3 - 187	545.001	1 Stein entfernen	. .2025
3 - 188	545.006	mehrere Steine entfernen	. .2025
3 - 189	545.001	1 Stein entfernen	. .2025
3 - 190	545	1 Stein aus Sohle entfernen	. .2025
3 - 191	545	1 Stein aus Sohle entfernen	. .2025
3 - 192	045.011	1 Stein aus Sohle entfernen	. .2025
3 - 193	045.002	Stau ausbauen, Schacht säubern	. .2025
3 - 194	045.013	PKW-Rad entsorgen	. .2025
3 - 195	0348	Böschungsabbruch reparieren 25 m Faschinen	. .2025
3 - 196	0348	Böschungsabbruch reparieren 10 m Faschinen	. .2025
3 - 197	272	1 Stein aus Sohle entfernen	. .2025
3 - 198	252	1 Stein entfernen (Böschungsoberkante)	. .2025
3 - 199	252	1 Stein entfernen (Böschungsoberkante)	. .2025
3 - 200	252	Dränrohrreste entsorgen	. .2025
3 - 201	E25	mehrere Steine entfernen	. .2025
3 - 202	E25	Wall etwas abflachen und vor Ort einplanieren, Müll entsorgen	. .2025
3 - 203	048.016.001.001	Stirnwand umgefallen, Ausspülung, Rohre abgekippt	. .2025
3 - 204	255	2 Stück Abdeckgitter herstellen und auflegen	. .2025
3 - 205	255.004	Durchlass spülen	. .2025
3 - 206	550	Im Garten von Herrn Fahndrich tritt Wasser aus. Fugen prüfen, abdichten, dazu Gelän	. .2025
3 - 207	048.011	2 Steine aus S4 entfernen, Steigeisen sind nicht sicher, nur mit Leiter einsteigen!!!	. .2025
3 - 208	048.011	Markierungspfahl wieder aufstellen	. .2025
3 - 209	071	S3 Konus abgefahren, neu aufsetzen (Kein Schachtdeckel, sondern Abdeckung (einteil	. .2025
3 - 210	217	Bohle anfertigen und im Schöpfwerksgebäude einlagern (U80), L*B*H	. .2025
3 - 211	217	Pumpe zieht Luft, Schwimmkörper prüfen, ggf. Wasser absaugen oder mit Gewicht bel	. .2025
3 - 212	0248	Anruf Herr Ebel am 06.11.2023: Auslauf der RL in das Gew-Nr. 251048 prüfen (dazu n	.2025
3 - 213	048.019	Durchlass freilegen, ggf. Rohre richten, mit Vlies abdecken, mit Kies/Schotter verfüllen	. .2025
3 - 214	048.018	Durchlass mind. 1 Rohr neu ansetzen, Schotterbettung, dichten, verfüllen	. .2025
3 - 215	251048	1 Stein (Böschungsfuss) entfernen	. .2025
3 - 216	051	1 Stein entfernen	. .2025
3 - 217	E224.002	mehrere Steine entsorgen	. .2025
3 - 218	251048	Teichböschung neu aufziehen	. .2025
3 - 219	251.027	naturnahen Abschnitt auf Holzung und Grundräumung prüfen, insbesondere Zulauf zu	. .2025
3 - 220	E25	Spindel fest, am 18.07. ausgebaut, am 2024 wieder montiert	. .2025
3 - 221	E224	mehrere Steine aus Böschung entfernen	. .2025
3 - 222	048.021	Schachtabdeckung gebrochen, neue Abdeckung auflegen, Deckel ist ok	. .2025
3 - 223	071.004	1 Rohr DN 500 am Auslauf neu ansetzten und dichten	. .2025
3 - 224	071	S5 aufgraben, reparieren, nach S4 und S6 Haltungen reinigen und mit Kamera befahre	. .2025
3 - 225	071.004	Am Weg freimähen, freiholzen und prüfen ob Schacht vorhanden ist.	. .2025
3 - 226	545	Rückstau durch Laub etc. Hinweis durch Jäger, GR von Hand erforderlich	. .2025
3 - 227	545.001	Steine entsorgen	. .2025
3 - 228	219	Krautbalken neu befestigen	. .2025
3 - 229	251048	Naßstelle mit KG-Rohr zum Roten Bach anschließen	. .2025
3 - 230	251048	Naßstelle verfüllen mit Boden aus Profilierung; Feldsteine als Dränung und Böschungsf	. .2025
3 - 231	739.005	Stau W52, Spindel reinigen und fetten	. .2025
3 - 232	253	Abbau der Zäune mit AG Rom klären	. .2025
